




工 事 名	H20. 連続立体交差事業遠州鉄道鉄道線 鉄道高架工事
工 事 目 的	鉄道高架工事
施 工 場 所	静岡県 浜松市 中区上島四丁目 地内
発 注 者	浜松市役所 南土木整備事務所
元 請 業 者	(株)泉組 常盤工業(株) (株)鈴木組 神谷建設(株)
施 工 業 者	株式会社 小澤土木
施 工 期 間	H21.3月 ~ H21.5月
施 工 機 械	スーパークラッシュ ゼロパイラー SCZ-600 × 2台
型 式 ・ 寸 法	ゼロ矢板 L=7.5m~9.5m 計414枚
特 長 ・ 効 果	<p>遠州鉄道を高架化するための橋脚築造工事において、仮線と民家とに挟まれた区間の土留め工法について、発注者である浜松市役所 南土木整備事務所よりご相談をいただき、ゼロクリアランス工法をご提案させていただきました。</p> <p>工期を短縮するためにゼロクラッシュパイラー2台を投入して圧入施工を実施しました。</p>

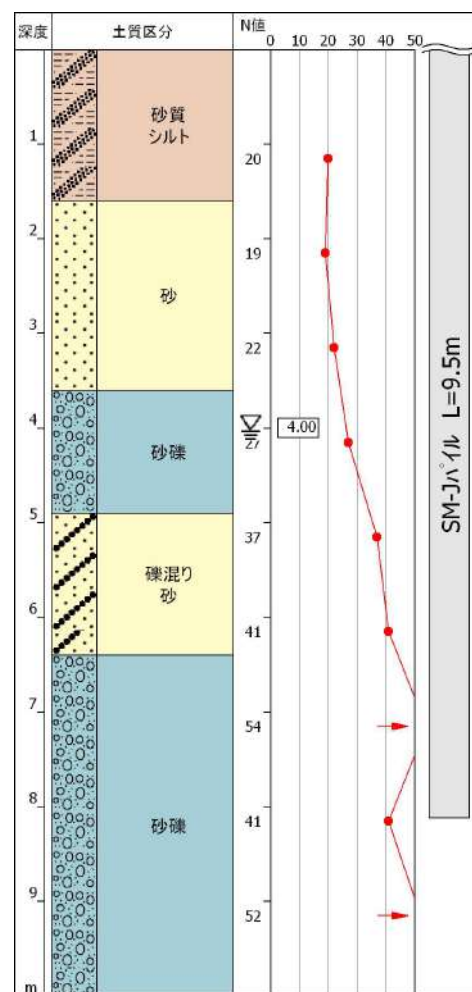

※50を超える場合は換算N値とする。
